



Provincie
Antwerpen

PROVINCIAAL RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN

DIENT RUIMTELIJKE PLANNING
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit



PRUP Bruggenbeemd te Herentals

Procesnota

Nummer	Datum	Versie
V3	30/05/24	Voorontwerp PRUP

Colofon



Opdrachtgever:

Provincie Antwerpen
Dienst Ruimtelijke Planning
Koningin Elisabethlei 22, 2000 Antwerpen
tel.: 03 240 66 00 fax: 03 240 66 79



Opdrachthouder:

Sweco Belgium
Posthofbrug 2-4, bus 1
BE-2600 Antwerpen

Projectnummer: RUP_10000_213_00134_00002

Datum	Versie
27/01/2022	Versie 1 - Kennisname door deputatie
02/03/2023	Versie 2 - Goedkeuring door deputatie
30/05/2024	Versie 3 - Kennisname door deputatie

Planteam

Initiatiefnemer
Ruimtelijk planners
MER-coördinator
Team MER

Provincie Antwerpen – Dienst Ruimtelijke Planning
Raïssa Bratkowski en Marlies Aerts (BUUR Part of Sweco)
Charlotte Verlinden (BUUR Part of Sweco)
Bjorn Vanstaeyen

Inhoud

0.	Inleiding	5
0.1.	Leeswijzer	5
0.2.	Kader en historiek	6
1.	Planningsproces	8
1.1.	Overzicht	8
1.2.	Procesnota	9
1.3.	Startnota	9
1.4.	Scopingsnota	9
1.5.	Voorontwerp PRUP en ontwerp Plan-MER	10
1.6.	Ontwerp RUP	10
1.7.	Definitief RUP en definitief plan-MER	10
2.	Begeleiding van het planningsproces	12
2.1.	Overzicht	12
2.2.	Samenstelling van het planteam	12
3.	Overzicht van actoren	12
4.	Communicatie en participatie	14
4.1.	Wijze van communicatie en participatie	14
4.2.	Startnota	14
4.3.	Verwerking van de resultaten van de publieke raadpleging	17
4.4.	Ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER	17
5.	Bijlage : overzicht afkortingen	18

0. Inleiding

0.1. Leeswijzer

De provincie Antwerpen wil voor de site Bruggenbeemd (voorheen gekend als Olympiadelaan) in Herentals het juridisch-planologisch kader voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen vastleggen. Dit gebeurt via een geïntegreerd planningsproces, dat zal resulteren in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Het geïntegreerde planningsproces voorziet als één van de eerste stappen in de opmaak van een procesnota, waarin het volledige verloop van het planningsproces wordt beschreven. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:

1. welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie;
2. hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse Regering.

De procesnota en de aangevulde procesnota's worden op dezelfde wijze gepubliceerd: op de website van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals.

Deze **procesnota** omvat volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 0* Inleiding
- Hoofdstuk 1* Beschrijving van het geïntegreerd planningsproces
- Hoofdstuk 2* Begeleiding van het geïntegreerd planningsproces
- Hoofdstuk 3* Overzicht van actoren
- Hoofdstuk 4* De organisatie van het overleg, communicatie en participatietraject
- Hoofdstuk 5* Bijlage : overzicht afkortingen

Voor meer informatie over het planningsproces kan u terecht bij:

Provincie Antwerpen
Dienst Ruimtelijke planning
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

ruimte@provincieantwerpen.be
03 240 66 23

0.2. **Kader en historiek**

De provincie neemt dit planinitiatief in uitvoering van het **Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen** (PBRA) evenals van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

Het RSPA en RSV bepalen namelijk dat de provincie Antwerpen de kleinstedelijke gebieden, waaronder Herentals, afbakt en onderzoekt of en waar een bijkomend aanbod nodig is voor woningen, bedrijventerreinen, randstedelijke groengebieden, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, recreatie enz.

Dit PRUP geeft uitvoering aan de beleidskaders 'Levendige kernen en Verdichten en ontlichten' van het PBRA.

0.2.1. AFBAKENINGSPROCES KLEINSTEDELIJK GEBIED (2013 – 2018)

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals werd in 2013 een voorstudie (Voorstudie Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals', Grontmij, eindrapport mei 2013) opgemaakt in opdracht van de provincie Antwerpen. Het woon- en woonuitbreidingsgebied Olympiadelaan werd in deze voorstudie als strategisch gebied voor stedelijke ontwikkelingen weerhouden, maar ook werd duidelijk dat er met heel veel verschillende ruimtevragers rekening gehouden moet worden: het aanwezige erfgoed, de Netevallei, de huidige activiteiten,...

Vervolgens werd een **plan-MER Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals** opgemaakt. In dit plan-MER werden de cumulatieve effecten van een maximaal programma onderzocht, ook voor het woon- en woonuitbreidingsgebied tussen Olympiadelaan en de spoorlijn.

Op basis van de inspraakreactie en adviezen op de kennisgevingsnota en ontwerp-MER maakte de dienst MER richtlijnen op, waarna het MER werd aangepast en aangevuld. Het plan-MER werd goedgekeurd op 13 oktober 2017.

Op 27 september 2018 heeft de provincieraad het **PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied Herentals** en 5 andere PRUP's voor het kleinstedelijk gebied Herentals definitief vastgesteld. Deze PRUP's zijn sinds 3 december 2018 van kracht.

Ook voor het strategisch gebied Bruggenbeemd (voorheen 'Olympiadelaan' genoemd) engageerde de provincie zich ook om een PRUP op te maken. De opmaak van dit PRUP vereiste echter verder onderzoek vanwege de complexiteit van het gebied en de verschillende ruimtevragen.

0.2.2. ONTWERPEND ONDERZOEK SITE BRUGGENBEEMD (2016 – 2018)

Op het gebied Bruggenbeemd liggen verschillende ruimtevragen. Het gebied is vandaag gekend als de site van de volkstuinten, voetbalclub SKS Herentals, bos, Kattenberg, Aveve,...

Als woon- en woonuitbreidingsgebied aan het station is het een interessante site om de toekomstige nood aan woningen op te vangen. Het is ook een potentiële locatie voor de verhuis van het ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth.

Het gebied kent een waterproblematiek en door de bruggen, indijking en verharding rond de Kleine Nete is het ook een ecologisch knelpunt.

Minder zichtbaar is dat hier een deel van de stadsomwalling lag en een deel van het gebied is beschermd als stadsgezicht.

De provincie Antwerpen liet een ontwerpend onderzoek uitvoeren door ontwerp bureau BRUT en LAMA om onder meer na te gaan of deze site van ca. 21,6 ha plaats kan bieden aan al deze vragen. Het resultaat van dit ontwerpend onderzoek werd vertaald in een **kaderplan** gebaseerd op 5 uitgangspunten en 7 ruimtelijke principes.

0.2.3. VERDER ONDERZOEK EN AFSTEMMING (2019 – 2023)

De stad Herentals, het Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie Antwerpen nemen elk een rol op zich om de visie uit het kaderplan om te zetten naar realisatie op het terrein (waaronder ook het voorzien van inspraak, communicatie, begeleiding bij zoeken naar alternatieve locaties,...).

Veel reacties tijdens de participatiemomenten uit 2018 hadden betrekking op het bouwvrij houden van het plangebied, of om de bebouwing te beperken tot een kleine oppervlakte nabij het station.

De provincie nam de reacties ter harte en startte bijkomend gebiedsgericht ontwerpmatig onderzoek op. Er werd een onderzoek naar alternatieve locaties voor het ziekenhuis opgestart.

En voor de site Bruggenbeemd zal worden onderzocht hoeveel ruimte voor bebouwing moet of kan worden voorzien, met respect voor de waardevolle groene omgeving en rekening houdend met effecten op landschap, mobiliteit, geluid,... en de financiële haalbaarheid van het project.

0.2.4. PRUP BRUGGENBEEMD

In 2018 werd een voorontwerp PRUP opgemaakt voor het strategisch gebied Olympiadelaan en werden de officiële adviesinstanties door de deputatie verzocht om advies uit te brengen over dit voorontwerp. Ook werd in het najaar van 2018 (aanvullend op de decretaal verplichte openbare onderzoeken) een participatiemoment georganiseerd over de krachtlijnen van het plan.


In 2020 besliste de deputatie om de eerder opgestarte procedure niet zonder meer verder te zetten. Het verder onderzoek en afstemming bracht immers nieuwe inzichten op. Maar vooral ziet de provincie een opportuniteit in de nieuwe geïntegreerde planningsprocedure volgens het decreet (Vlaamse Codex ruimtelijke ordening) om een aantal varianten die uit verder onderzoek naar voor kwamen - binnen bovenvermelde uitgangspunten en ruimtelijke principes - te kunnen afwegen alvorens de nieuwe bestemmingen en inrichtingsvoorschriften vast te leggen.

De afbakening van het plangebied werd bijgesteld en ook de naam werd aangepast tot PRUP Bruggenbeemd.

1. Planningsproces

1.1. Overzicht

Onderstaand schema geeft de concrete processtappen voor dit PRUP weer.

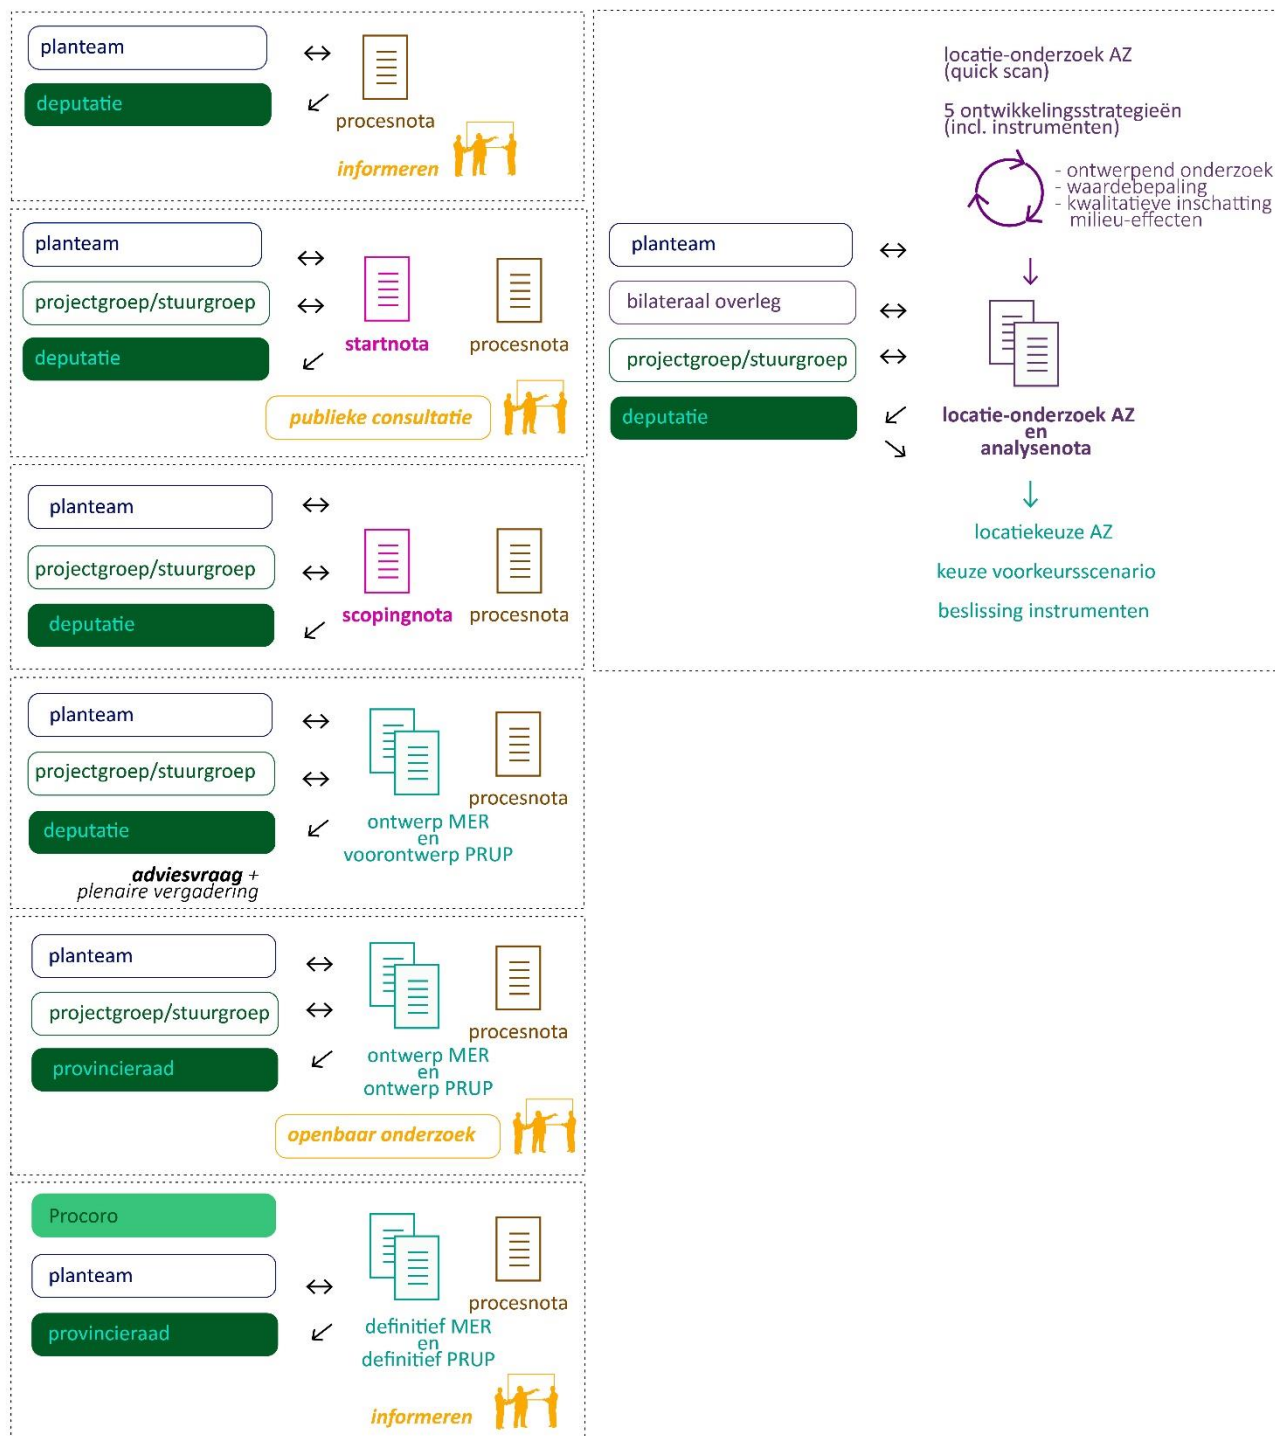

Figuur 1: Schematische weergave geïntegreerd planningsproces PRUP Bruggenbeemd

De geïntegreerde procedure, zoals decretaal in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) vastgelegd, werd in dit proces voorafgegaan door de uitwerking van een locatie-onderzoek voor het ziekenhuis en onderzoek van 5 (ruimtelijke) inrichtingsscenario's, die werden samengesteld op basis van eerder onderzoek.

Na de publieke consultatie en a de adviesvraag over de startnota werden nog twee scenario's toegevoegd waardoor 7 scenario's in het plan-MER onderzocht worden.

Er werd op drie sporen gewerkt om de inrichtingsscenario's tot ontwikkelingsstrategieën uit te werken: ze werden verfijnd aan de hand van ontwerpend onderzoek en (rudimentair) milieu-effectenonderzoek en ook het financiële aspect werd in beschouwing genomen.

Deze onderzoeken, inclusief de locatiestudie, zullen elementen aanreiken voor een grondige afweging over de gewenste ontwikkelingsstrategie voor het plangebied. Dit wordt vervolgens vertaald naar een voorontwerp grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.

Over het voorontwerp RUP en het ontwerp plan-MER zal op vraag van de deputatie advies worden ingewonnen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle stappen in het planningsproces in hoofdlijnen.

1.2. *Procesnota*

In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt een procesnota opgesteld die het volledige verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over :

1° welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie

georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie;

2° hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse Regering.

De procesnota en de aangevulde procesnota worden op dezelfde wijze gepubliceerd.

1.3. *Startnota*

De deputatie vraagt advies over de startnota. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag.

De deputatie informeert de bevolking uiterlijk de eerste dag van die termijn over de inhoud van de startnota, raadpleegt de bevolking over de startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert hierover ten minste één participatiemoment en maakt daarvan een verslag.

De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan de deputatie bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden, alsook de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de startnota. De deputatie bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage binnen een termijn van tien dagen na het afsluiten van de termijn.

1.4. *Scopingsnota*

Het planteam bespreekt en verwerkt de resultaten van de publieke raadpleging en advisering in een scopingnota.

De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.

Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER en/of RVR vereist is, geven het Team Milieueffectrapportage en het Team Externe Veiligheid van het departement Omgeving dit in hun advies over de scopingnota aan.

De bevoegde overheid stelt de scopingnota ter beschikking op haar website en laadt deze op in het digitale platform.

1.5. Voorontwerp PRUP en ontwerp Plan-MER

In deze fase wordt het voorontwerp PRUP opgemaakt en het ontwerp effectrapport.

Na goedkeuring van het voorontwerp PRUP en het ontwerp effectrapport door de deputatie, wordt advies ingewonnen bij de instanties die ingevolge de toepasselijke regelgeving hiervoor bevoegd zijn. In dat kader kan ook een plenaire vergadering georganiseerd worden.

1.6. Ontwerp RUP

Het ontwerp PRUP met bijhorende effectbeoordeling wordt opgemaakt door het planteam op basis van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces, de adviezen van de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire vergadering.

Het ontwerp RUP wordt voorgelegd aan de provincieraad voor voorlopige vaststelling.

Het voorlopig vastgestelde ontwerp RUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen.

De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) bezorgd.

1.7. Definitief RUP en definitief plan-MER

De PROCORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de provincieraad.

Het definitief planmilieueffectenrapport wordt opgemaakt en het team Milieueffectenrapportage beoordeelt de kwaliteit van het planmilieueffectrapport. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek wordt het RUP eventueel aangepast.

De provincieraad stelt binnen honderdtachtig dagen (verlengbaar tot tweehonderdveertig dagen) na het einde van het openbaar onderzoek het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek

geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement Omgeving.

De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 45 dagen om de uitvoering van het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen of te vernietigen.

Als het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan niet tijdig is geschorst of vernietigd, stuurt de deputatie een afschrift van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, van het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening en van het vaststellingsbesluit naar de stad Herentals, waar deze documenten kunnen worden ingezien.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de provincieraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

2. Begeleiding van het planningsproces

2.1. *Overzicht*

Het PRUP en geïntegreerde effectenbeoordeling wordt opgevolgd door :

- het planteam : het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking.
- de Projectgroep Bruggenbeemd: is het ambtelijk overlegplatform waarin de trekkers van concrete acties (waaronder het PRUP) onderling afstemmen en het overleg van de stuurgroep voorbereiden (samenstelling : zie hoofdstuk 3 Overzicht van actoren).
- de stuurgroep Bruggenbeemd: is het politieke overlegplatform en staat in voor de voortgang van het actieplan en het bewaken van de gemeenschappelijke visie en de timing (samenstelling : zie hoofdstuk 3 Overzicht van actoren).
- de deputatie : de deputatie vervult de decretaal toegewezen taken in het planningsproces zoals bepaald in de VCRO.
- de provincieraad : de provincieraad vervult de decretaal toegewezen taken in het planningsproces zoals bepaald in de VCRO en meer bepaald de voorlopige en definitieve vaststelling van het PRUP.
- De Procoro : de Procoro is decretaal een adviserende rol toebedeeld. Ook staat de Procoro in voor het bundelen en coördineren van alle adviezen, opmerkingen en bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De Procoro brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de provincieraad.

2.2. *Samenstelling van het planteam*

Het planteam is verantwoordelijk voor de opmaak van het PRUP en voor de begeleiding van het planningsproces.

De dienst Ruimtelijke Planning trekt dit planningsproces binnen Provincie Antwerpen en laat zich voor de opmaak van het PRUP en effectenstudie inclusief voorstudie bijstaan door een extern adviesbureau, Sweco Belgium. De externe verantwoordelijke ruimtelijk planner en Mer-coördinator maken beiden deel uit van het planteam.

Aangezien voor dit PRUP een volwaardig Plan-MER zal worden opgemaakt, is eveneens een afvaardiging van Team Mer lid van het planteam.

De dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) is niet opgenomen in het planteam omdat op basis van de beoogde ontwikkelingsmogelijkheden op dit ogenblik wordt aangenomen dat een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) niet vereist is.

Leden van het planteam voor het PRUP Strategisch gebied Bruggenbeemd zijn:

- Dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Antwerpen: Tine Van Hoof en Veerle Van Dooren
- Team Omgevingseffecten: Björn Van Staeyen
- Externe deskundige – Erkend ruimtelijk planner: Raïssa Bratkowski, Marlies Aerts en Fran Lux
- Externe deskundige –MER-coördinator: Charlotte Verlinden

Het planteam besprak het ontwerp MER en voorontwerp RUP op 18/04/2024

3. Overzicht van actoren

De provincie acht een constructieve samenwerking met de lokale overheden in planningsprocessen essentieel.

Stad Herentals is, als lokaal bestuur, dan ook een belangrijke partner in dit planningsproces.

Voor de advisering van de startnota, het voorontwerp PRUP en ontwerp PRUP inclusief effectenstudie zullen de instanties worden aangeschreven, conform de vigerende bepalingen.

Volgende instanties zijn eveneens betrokken als lid van de ambtelijke projectgroep en de politieke stuurgroep :

- Stad Herentals
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- Agentschap Onroerend Erfgoed
- Departement Omgeving
- Agentschap Natuur en Bos

Betrokken stakeholders zijn :

- AZ Sint-Elisabeth
- AWV
- Aquafin
- Infrabel
- voetbalclub SKS Herentals
- de eigenaars van de gronden in het plangebied
- de volkstuinders, in het bijzonder Tuinhier vzw

het voorontwerp RUP en het ontwerp MER zullen plenair worden besproken op 4/07/2024.

4. Communicatie en participatie

4.1. *Wijze van communicatie en participatie*

De provincie Antwerpen communiceert over dit lopende planningsproces via de website www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals.

Op deze website wordt de stand van zaken weergegeven. Ook documenten m.b.t. het dossier zijn raadpleegbaar via deze weg.

Dit planningsproces is reeds voorafgegaan door een afbakeningsproces en de opmaak van een kaderplan (Eindnota ontwerpend onderzoek Vallei van de Kleine Nete in kleinstedelijk gebied Herentals door BRUT – LAMA, 2018) en bijhorend participatietraject.

Een eerste brede communicatie in het kader van het overkoepelend planningsproces Bruggenbeemd vond plaats op 9/06/2021, 10/06/2021 en 13/06/2021 met respectievelijk een persmoment, een webinar en een wandeling.

De publieke raadpleging over de startnota liep van 11 februari tot en met 11 april 2022.

Na de voorlopige vaststelling door de provincieraad zal over het ontwerp PRUP en geïntegreerde effectbeoordeling een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

De coördinatie en sturing van de raadpleging zal gebeuren door het planteam.

Ook zal op het ruime publiek op verschillende momenten worden geïnformeerd. Dit zal gebeuren via de website van de provincie en de digitale nieuwsbrief van het PRUP. De stand van zaken in het planningsproces zal er worden weergegeven en eventueel zullen documenten digitaal ter beschikking worden gesteld.

De voortgang en (tussentijdse) resultaten van het planproces werd voorgelegd aan de projectgroep en stuurgroep op volgende data :

- projectgroep: 1/04/2021, 15/09/2021, 31/05/2022 en 10/10/2022
- stuurgroep: 27/04/2021, 20/10/2021, 16/06/2022, 8/11/2022 en 25/10/2023

In functie van informatie-uitwisseling werd bilateraal afgestemd met volgende actoren:

- AZ Sint-Elisabeth : 26/02/2021 en 29/03/2022
- Agentschap Onroerend erfgoed : 7/10/2021
- Agentschap Wegen en Verkeer : 11/03/2021 en 10/10/2022
- Aquafin : 4/06/2021
- Infrabel : 22/07/2023

4.2. *Startnota*

De startnota werd aan de bevolking, het departement, de adviesinstanties, het colleges van burgemeester en schepenen van de stad Herentals en de PROCORO voorgelegd met de vraag suggesties of adviezen te formuleren. Er wordt een terinzagelegging voorzien met een inspraaktermijn van 60 dagen.

De publieke raadpleging liep van 11 februari tot en met 11 april 2022.

Gedurende deze periode werd een participatiemoment voorzien. Hiervan werd een verslag opgemaakt en dit werd publiek gemaakt. Het publiek werd uitgenodigd om inspraak te geven op het planvoorstel en het vooropgesteld onderzoek.

Inspraak is mogelijk over bv. alternatieven voor (delen van) het plan, over de te onderzoeken milieueffecten en/of de aanpak van dit onderzoek. Ook kan kennis over het plangebied ingebracht worden. Input over te betrekken stakeholders of vragen rond bijkomende participatie in het vervolgtraject is eveneens mogelijk.

Informatie over de openbaarmaking van de startnota:

Wijze van aankondiging	• Aanplakking van gele affiche in de stad Herentals • Een bericht in het Belgisch Staatsblad • Een bericht dat in ten minste drie dag- of infobladen die in de provincie worden verspreid • Een bericht op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be) • Persbericht • Nieuwsbrief Dienst Ruimtelijke Planning • Nieuwsbrief en/of sociale mediakanalen van de gemeente
Plaatsen waar de documenten beschikbaar zijn	De documenten konden digitaal en analoog geraadpleegd worden als volgt. Digitaal via de website van de bevoegde overheid provincie Antwerpen op www.provincieantwerpen.be. Analoog tijdens de openingsuren: - Provincie Antwerpen – dienst ruimtelijke planning, Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66 23) - Administratief centrum Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Periode van publieke raadpleging	Zowel de startnota als de procesnota worden, zowel analoog als digitaal, gedurende 60 dagen ter beschikking gesteld, van 11 februari tot en met 11 april 2022.
Participatiemoment	De provincie Antwerpen organiseerde een participatiemoment op 22/02/2022 van 16.00 tot 21.00 in zaal 't Hof, Grote Markt 41 te 2200 Herentals. Tijdens dit infomoment kon de startnota worden ingekeken en vragen gesteld worden. Door de covidmaatregelen moest in functie van de veiligheid vooraf worden ingeschreven voor een tijdslot, via de webpagina www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals of het telefoonnummer 03/240 66 23.
Hoe kunt u reageren?	Reacties konden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak, dus uiterlijk op 11 april 2022, per aangetekend schrijven bezorgd worden aan of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan: - Deputatie Provincie Antwerpen, Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen - Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

	De opmerkingen konden digitaal verzonden worden naar het e-mailadres: ruimte@provincieantwerpen.be Er werd ook een digitaal inspraakformulier ter beschikking gesteld op bovenvermelde website van de provincie Antwerpen. Op het infomoment op 22 februari 2022 kon tegen ontvangstbewijs een reactie ingediend worden.
--	---

Er werden 17 reacties ingediend waaronder één door de GECORO en één door het AZ Herentals.

Onderstaande adviesinstanties werden geconsulteerd via het uitwisselingsplatform voor digitale informatie (DSI) :

- Stad Herentals
- Procoro
- Departement Omgeving
- Agentschap Onroerend erfgoed
- Vlaamse Landmaatschappij
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Agentschap Innoveren en Ondernemen
- Agentschap Wonen Vlaanderen
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Agentschap Wegen en Verkeer
- De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Infrabel
- De Lijn
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Sport Vlaanderen
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- OVAM
- het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
- Fluxys
- EANDIS

Er werd advies uitgebracht door volgende adviesinstanties :

1. PROCORO
2. College van burgemeester en schepenen stad Herentals
3. Agentschap Wegen & Verkeer (AWV)
4. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
5. Agentschap Onroerend Erfgoed
6. Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
7. Sport Vlaanderen
8. Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
9. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
10. Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM)
11. Fluxys
12. De Lijn
13. NMBS
14. Infrabel
15. Departement Omgeving

Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een verzameling van adviezen en inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment.

Het verslag werd gepubliceerd op bovenvermelde webpagina.

4.3. Verwerking van de resultaten van de publieke raadpleging

De dienst bevoegd voor milieueffectenrapportage ontving alle adviezen en reacties over de startnota om op basis daarvan de MER-verplichtingen verder te beoordelen.

Het planteam behandelde op 20/05/2022 en 8/07/2022 de uitgebrachte adviezen en reacties. Op basis van de startnota en de uitgebrachte adviezen en reacties werd de scopingnota opgemaakt. Concreet betekent dat het volgende:

- Elke opmerking, bezwaar of suggestie werd bekeken en besproken.
- Het planteam onderzocht op basis van welke bezwaren, suggesties,... het onderzoek zoals beschreven in de startnota moet worden aangepast.
- Voor een aantal opmerkingen/bezwaren motiveerde het planteam waarom het onderzoek niet aangepast werd.
- De opmerkingen, bezwaren en suggesties werden verwerkt in de scopingnota.
- Er worden geen persoonlijke antwoorden gestuurd naar de bezwaarindiener en de scopingnota bevat ook geen specifiek antwoord op elke reactie of elk advies.

4.4. Ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER

Na de voorlopige vaststelling, zal het ontwerp PRUP 60 dagen onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

De aankondiging van het openbaar onderzoek zal verlopen conform de VCRO.

Ook in het kader van het openbaar onderzoek zal een informatiemoment worden georganiseerd. Bezwaren en opmerkingen dienen bezorgd te worden aan de Procoro.

5. Bijlage : overzicht afkortingen

MER	milieu-effectenrapport
plan-MER	plan-milieu-effectenrapport
PROCORO	Provinciale commissie ruimtelijke ordening
PRUP	provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan
RUP	ruimtelijk uitvoeringsplan
RVR	ruimtelijk veiligheidsrapport
VCRO	Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
